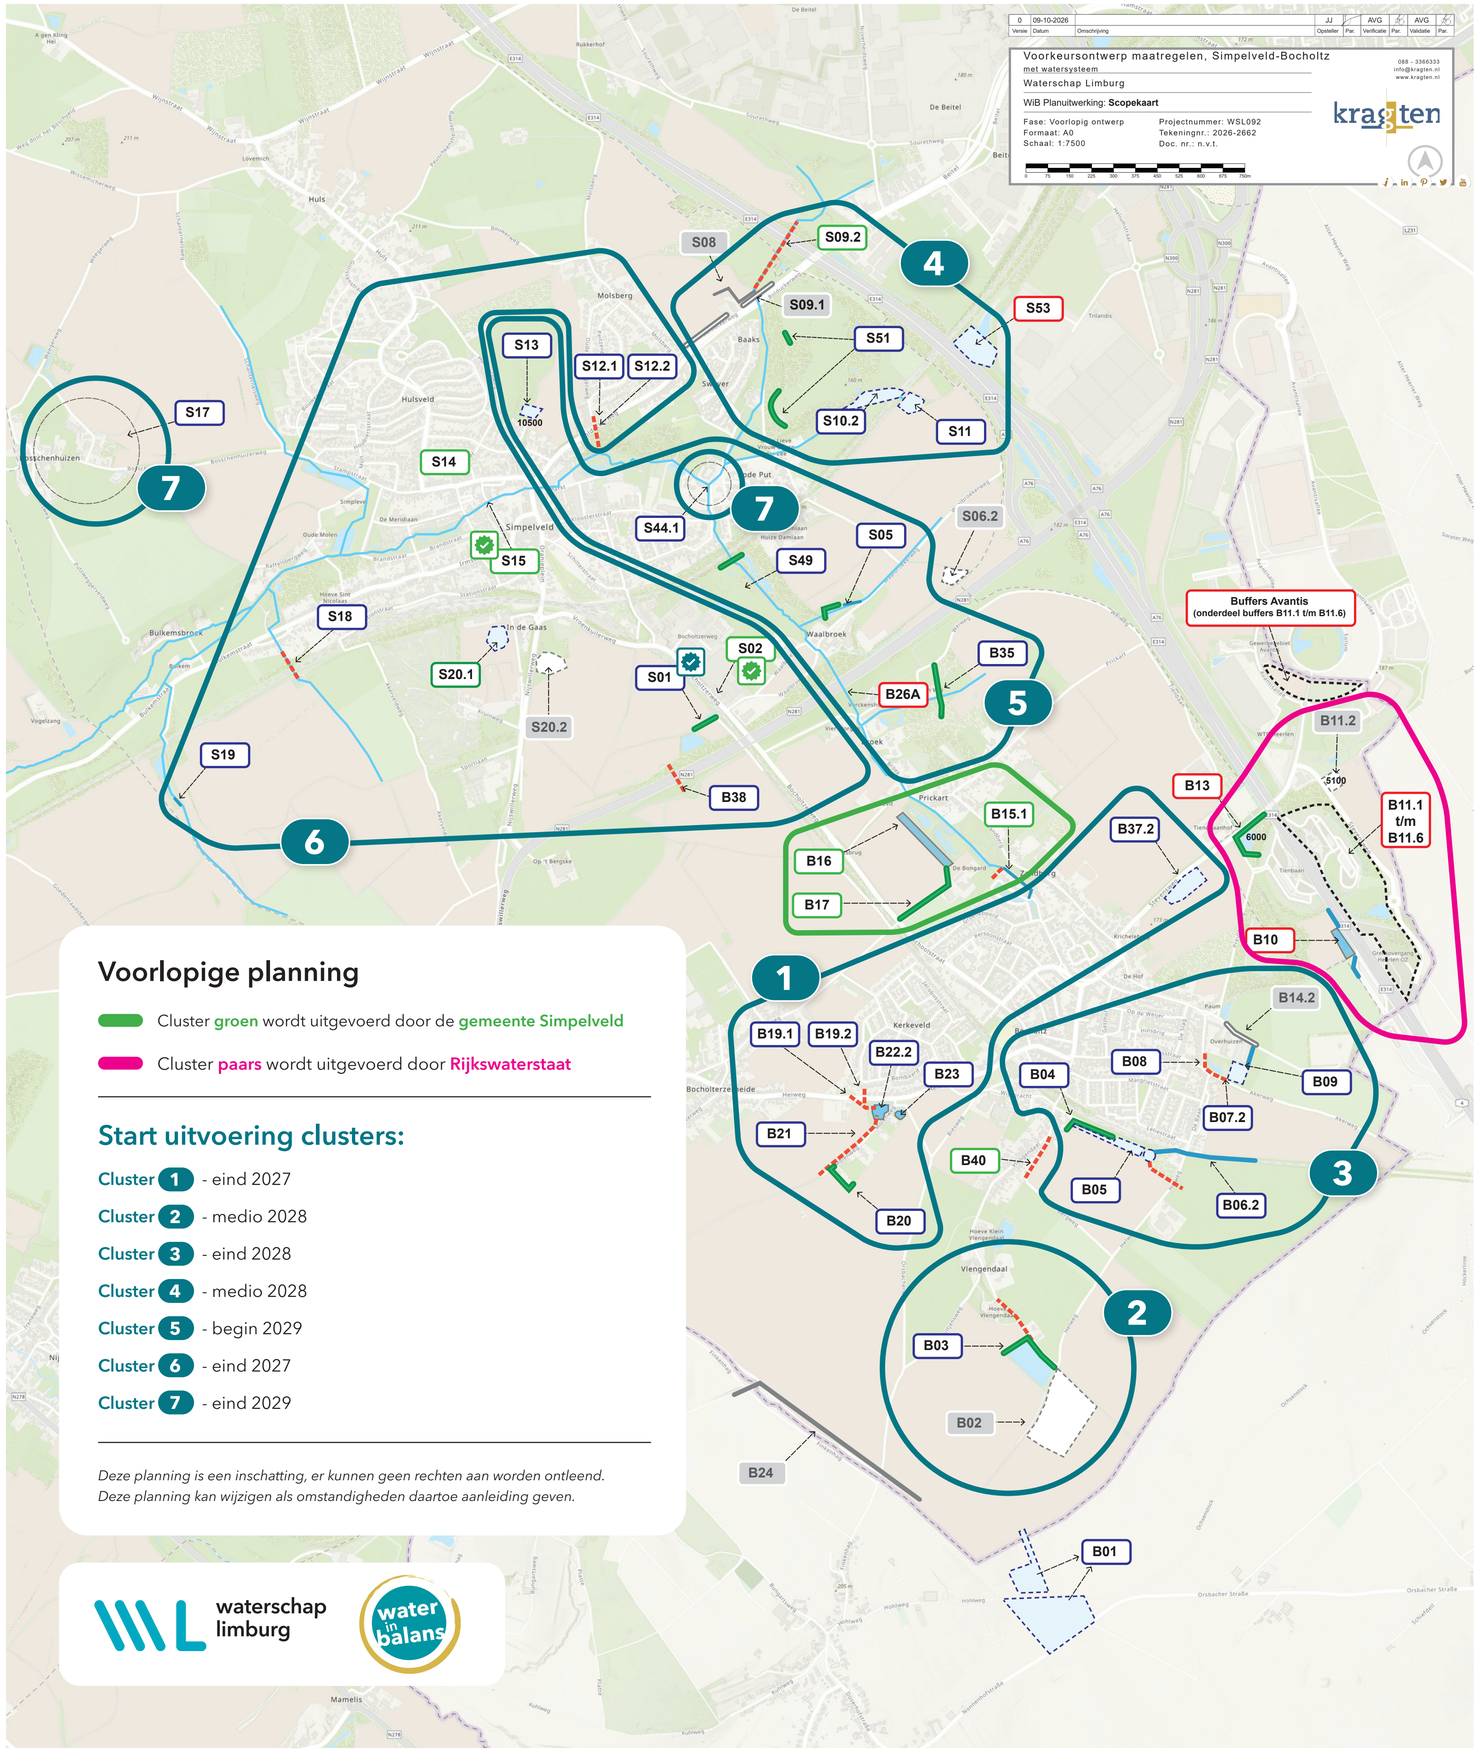

Voorlopige planning

Cluster **groen** wordt uitgevoerd door de **gemeente Simpelveld**

Cluster **paars** wordt uitgevoerd door **Rijkswaterstaat**

Start uitvoering clusters:

- Cluster 1 - eind 2027
- Cluster 2 - medio 2028
- Cluster 3 - eind 2028
- Cluster 4 - medio 2028
- Cluster 5 - begin 2029
- Cluster 6 - eind 2027
- Cluster 7 - eind 2029

Deze planning is een inschatting, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Deze planning kan wijzigen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

waterschap limburg

water in balans

Legenda

- Maatregelnummers Simpelveld (S18)
- Maatregelnummers Bocholtz (B38)
- Inhoud buffers in m3 (66900)
- Maatregelen duikers en overige kunstwerken/elementen
- Nieuwe buffer
- Nieuw(e) dijk(je)
- Nieuwe watergang
- Maatregelen WL (S05)
- Maatregelen partners (B13)
- Maatregelen Gemeente Simpelveld of Heerlen (B15.1)
- Vervallen maatregel (B14.2)

Verklaring maatregelnummers

Cluster 1 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - eind 2027*
B19.1	Drempel aanbrengen op de Heiweg om water te geleiden
B19.2	Instroom vanaf Heiweg verbeteren richting buffer
B20	Dijkje aanleggen
B21	Maatregelen treffen t.b.v. afvoer richting buffer Heiweg-Molenweg
B22.2	Capaciteit bestaande buffer aanpassen naar 6600 m³
B23	Capaciteit bestaande buffer aanpassen naar 2250 m³
B37.2	Buffer realiseren met 5750m3 bergingscapaciteit en instroom weg aanpassen

Cluster 2 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - medio 2028*
B03	Buffer verdiepen en leegloop aansluiten op regenwaterriool

Cluster 3 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - eind 2028*
B04	Buffer realiseren, bergingscapaciteit n.t.b.
B05	Capaciteit bestaande buffers vergroten
B06.2	Verruimen spoorsloten en verbeteren afvoer t.p.v. De Baan
B07.2	Instroom van de buffer verbeteren
B08	De kade aan de zuid- en westzijde van de buffer verhogen en leegloop koppelen aan toekomstig HWA
B09	Buffer realiseren met 4000 m³ bergingscapaciteit en nieuwe watergang t.b.v. watergeleiding

Cluster 4 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - medio 2028*
S10.2	Buffer realiseren met 12.700 m³ bergingscapaciteit
S11	Buffer realiseren met 6.700 m³ bergingscapaciteit
S51	Buffer realiseren in Groeve Sweijer met 3.900 m³ bergingscapaciteit

Cluster 5 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - begin 2029*
B35	Buffer realiseren met 14.200 m³ bergingscapaciteit
S05	Instroom bestaande buffer verbeteren
S13	Buffer realiseren met 5.600 m³ bergingscapaciteit
S44.1	Lokale maatregelen Parkhof (knop 4)
S49	Aanleg bufferdam tegen talud spoorlijn

Cluster 6 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - eind 2027*
B38	Bovenstrooms water bergen door de duiker te knijpen en maatregelen om water richting duiker te geleiden
S12.1	Geul aanbrengen in maaiveld om water richting beek te geleiden (Rolduckerweg)
S12.2	Goot aanbrengen in Rolduckerweg om water richting beek te geleiden
S18	Bestaande duiker onder het spoor knijpen
S19	Instroom van de bestaande buffer verbeteren

Cluster 7 maatregelen - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - eind 2029*
S44.1	Lokale maatregelen Parkhof (knop 4)
S17	Lokale maatregelen Bosschenhuizen (knop 4)

Maatregel - Waterschap Limburg	*Start uitvoering - onbekend*
B01	Buffer realiseren met 46.500 m³ bergingscapaciteit in Duitsland

Maatregelen - Gemeente Simpelveld	
B15.1	Verbeteren instroom van de watergang en optimaliseren watergang achter kavels; aansluiting op groenblauwe ader
B16	Vergroten bestaande buffer Bongard
B17	Verlaging langs de weg realiseren om water richting buffer Bongard te geleiden
B40	Afkoppelen Pleiweg
S09.2	Deelmaatregel gemeente Heerlen: dynamische schuif in duiker + onderhoudspad (grondgebied Heerlen)
S14	Riolering afkoppelen en goede afvoer regelen
S20.1	Buffer realiseren met 5.500 m3 bergingscapaciteit in toekomstige vakantiepark

Maatregelen - Rijkswaterstaat / Provincie	
B10	Bestaande buffer vergroten
B11.1 t/m B11.6	Diverse buffers op terrein Tienbaan / voormalige grensovergang Rijkswaterstaat
B13	Buffer vergroten optimaliseren door verhogen dijkje
B26A	Structureel onderhoud plegen aan de duiker onder provinciale weg
S53	Buffer RWS t.b.v. Medtronics

Uitgevoerde maatregelen – Waterschap Limburg, gemeente Simpelveld en Rijkswaterstaat	
S01	Dijkje realiseren tot circa +154,30m NAP om meer water te bufferen
S02	Pijplijnmaatregelen gemeente
S15	Drempel en muurtjes op de brug verwijderen

Vervallen maatregelen – Waterschap Limburg, gemeente Simpelveld en Rijkswaterstaat	
B02	Buffer realiseren, bergingscapaciteit n.t.b.
B14.2	Vrijgekomen grond van buffer B09 verwerken in watergang t.b.v. watergeleiding
B24	Nieuwe watergang realiseren en water richting andere zijde van de heuvel sturen
S06.2	Buffer realiseren met 2.500 m³ bergingscapaciteit
S08	Dijkje realiseren tot circa +156,15 NAP om meer water te bufferen
S09.1	Aanpassingen instroom Rolduckerweg binnen gemeente Simpelveld
S20.2	Buffer realiseren met 7.500 m³ bergingscapaciteit
B11.2	Buffer RWS (is verplaatst richting terrein Avantis)
